
	Brunnenbau Havelquell GmbH Quellweg 4 14938 Märkischheide Deutschland	Ausbauprotokoll **Brunnen**	Lage Höhe: 0,00m Breite: 53,465 Länge: 12,372

Baustellennummer		Referenz der Bohrung	Brunnen
Leistungszeitraum	08.09.2026		

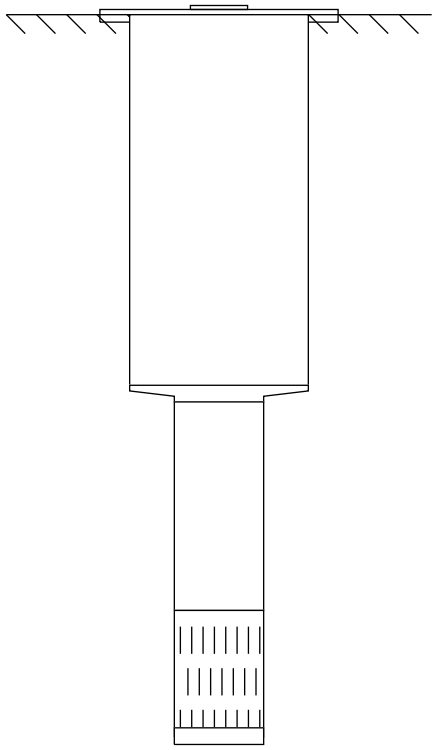

Tiefe von	Tiefe bis	Ausbauelement	Ø	Bemerkungen
-0,50m	1,00m	Brunnenstube	400/400mm	PE (Polyethylen)
Strang				
0,00m	50,00m	Vollwandrohr	290/300mm	PE (Polyethylen)
50,00m	52,00m	Übergangsstück	290/300mm	Übergang von 290/300mm auf 140/150mm, PE (Polyethylen)
52,00m	80,00m	Vollwandrohr	140/150mm	PE (Polyethylen)
80,00m	97,00m	Filterrohr, geschlitzt	140/150mm	PE (Polyethylen)
97,00m	98,00m	Sumpfrohr	140/150mm	PE (Polyethylen)

Bemerkungen	---
Techniker	Max Mustermann
Unterschrift des Technikers	

Erstellt mit BoreDoc
